



Immeuble Les Bureaux des Trois Fontaines
B.P. 1031
95003 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : 01 34 25 91 68 - Fax : 01 34 25 91 39
e.mail : euroceramic@worldonline.fr

En cas de demande spécifique, n'hésitez pas à nous retourner le présent formulaire dûment rempli.

De :

Tél :

Fax :

Maître d'ouvrage :

Chantier :

Maître d'oeuvre :

Entreprise(s) :

.....
.....

DONNEES DU CALCUL POUR LA JUSTIFICATION DE LA TENUE MECANIQUE DES TUYAUX SELON LE FASCICULE 70.

1- Conditions liées au tuyau.

Diamètre nominal du tuyau

D =(mm)

2 - Caractéristiques liées aux sols

Groupe de sol	Description
G1	Sables et graves propres, concassés (Dmax < 50 mm). Sables ou graves peu silteuses.
G2	Sables ou graves peu argileux.
G3	Sables et graves très silteux, limons peu plastiques, sables fins peu pollués (IP < 12).
G4	Sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, limons argiles et marnes peu plastiques (IP < 25).
G5	Argiles et argiles marneuses, limons très plastiques (IP > 25)

- Groupe de sol n° :

- Hauteur de couverture :

Nappes phréatiques

Oui

Non

Si oui, hauteur par rapport

à la génératrice supérieure : m


3 - Nature du compactage

NC


CCNV

CCVq4


CCVq5

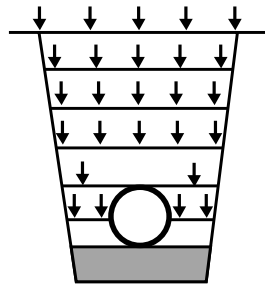

Compacté, contrôlé,
validé (q_4 et q_5)
Cas recommandé

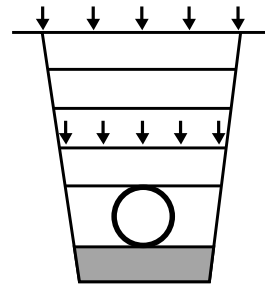


Compacté, contrôlé,
non validé

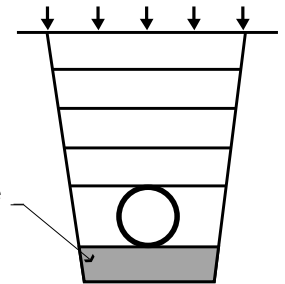


Lit de
pose

Mise en place
non contrôlée


4 - Type de retrait des panneaux de blindage

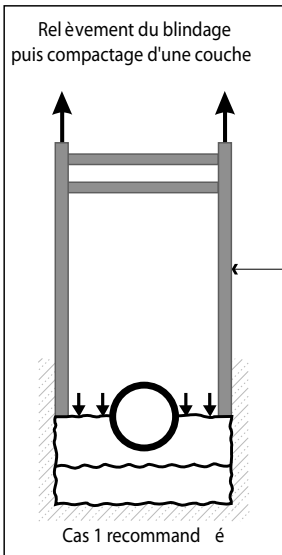

Compactage d'une couche
avant relèvement du blindage



Remblaiement total puis
enlèvement du blindage

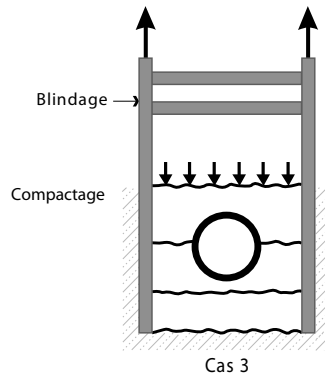

Cas 1

Cas 2

Cas 3

5 - Charges Roulantes

Oui

Non
